

Puerto Quetzal,
03 abril de 2023

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

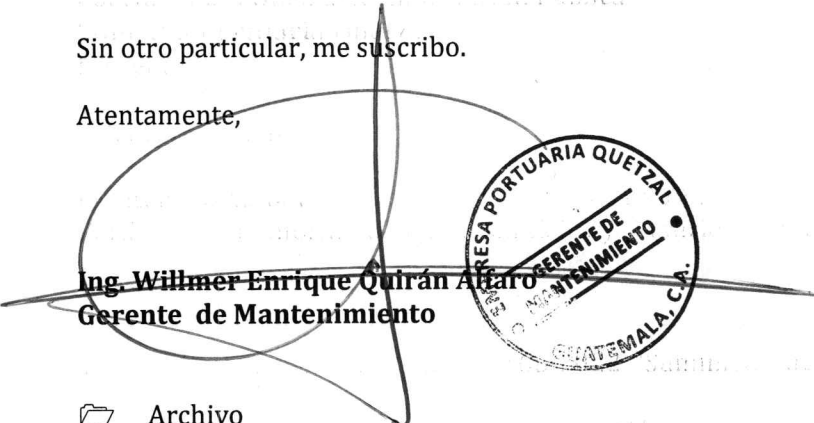
Licenciada Jiménez:

En atención al oficio UIP-70-2,023 de fecha 20 marzo del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen.

1. Contrato Administrativo A-166-2022 "Suministro de energía eléctrica y potencia"
2. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria Quetzal.
3. Contrato Administrativo A-1405-2022 "Suministro de materiales químicos para la red de agua".
4. Contrato Administrativo A-002-2023 "Mantenimiento y reparación de estructuras, techos de parqueos y señalización dentro y fuera del Recinto Portuario"

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Ing. Willmer Enrique Quirán Alfaro
Gerente de Mantenimiento



 Archivo

/lg.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA, PUERTO QUETZAL
PBX 782835-00, OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA 4ª. CALLE 7-53 ZONA 9
EDIFICIO TORRE AZUL, 1ER. NIVEL, TELEFONOS 23611370
PBX 23125000 FAX 23611327, APARTADO POSTAL 206-A
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com GUATEMALA, C.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				2359828-K		
Contrato Administrativo número A guion ciento sesenta y seis guiñón dos mil veintidós (A-166-2022) de fecha doce de enero de dos mil veintidós (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 11 de FEBRERO de 2022 al 10 MARZO de 2023.-						
1	TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022				11/02/2022	
1.2	Fecha de Finalización:				10/02/2025	
1.3	Meses autorizados	36				
1.4	Meses Periodo de Transición	0				
1.5	Total de Meses del Servicio	36		100.00 %		
1.6	Meses utilizados	13		36.11 %		
1.7	Meses por ejecutar	23		63.89 %		
2	MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA					
	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO	
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE		
		27,901,888.00	Q 44,084,983.04	100.00 %		
2.1	FEBRERO 2022	783,546.00	Q 1,238,002.68	2.81 %	11/02/2022	10/03/2022
2.2	MARZO 2022	973,455.00	Q 1,538,058.90	3.49 %	11/03/2022	10/04/2022
2.3	ABRIL 2022	945,140.00	Q 1,493,321.20	3.39 %	11/04/2022	10/05/2022
2.4	MAYO 2022	940,800.00	Q 1,486,464.00	3.37 %	11/05/2022	10/06/2022
2.5	JUNIO 2022	816,165.00	Q 1,289,540.70	2.93 %	11/06/2022	10/07/2022
2.6	JULIO 2022	930,475.00	Q 1,470,150.50	3.33 %	11/07/2022	10/08/2022
2.7	AGOSTO 2022	1,002,120.00	Q 1,583,349.60	3.59 %	11/08/2022	10/09/2022
2.8	SEPTIEMBRE 2022	934,850.00	Q 1,477,063.00	3.35 %	11/09/2022	10/10/2022
2.9	OCTUBRE 2022	1,174,285.00	Q 1,855,370.30	4.21 %	11/10/2022	10/11/2022
2.10	NOVIEMBRE 2022	1,130,360.00	Q 1,785,968.80	4.05 %	11/11/2022	10/12/2022
2.11	DICIEMBRE 2022	1,092,700.00	Q 1,726,466.00	3.92 %	11/12/2022	10/01/2023
2.12	ENERO 2023	994,350.00	Q 1,571,073.00	3.56 %	11/01/2023	10/02/2023
2.13	FEBRERO 2023	888,545.00	Q 1,403,901.10	3.18 %	11/02/2023	10/03/2023
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		12,606,791.00	19,918,729.78	45.18 %		
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		15,295,097.00	Q 24,166,253.26	54.82 %		


Raúl Vicente Constanza Morales
SUPERVISOR





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022

ACTUALIZADOS AL 23 FEBRERO DE 2023

-expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

8666568-5

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal, como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de Noviembre de 2021 al 23 de Febrero de 2023.

1	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO			24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60	100.00 %		
1.4	Total Meses Ejecutados	15	25.00 %		
1.5	Meses por ejecutar	45	75.00 %		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA			PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50	100.00 %		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	2.94 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	1.26 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	1.97 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	2.47 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	1.41 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	1.83 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	3.21 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	1.26 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	1.43 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	1.05 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	1.17 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	3.50 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	2.95 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	1.25 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	1.97 %	24/01/2023	23/02/2023
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q5,152,740.17	29.66 %	100.00 %	
	MONTO POR EJECUTAR	Q12,218,800.33	70.34 %		

Raul Vicente Constanza Morales

Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1405-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			97837393
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos cinco guión dos mil veintidos (A-1405-2022) de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidos (27-10-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "SUMINISTROS DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2022.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		14/12/2022
1.2	Fecha Oficial Finalización:		14/12/2023
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	12	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	12	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	3	25.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	9	75.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 526,440.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 87,740.00	16.67%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 438,700.00	83.33%

f.

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-002-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			4841875
En referencia al contrato administrativo numero A guión dos guión dos mil veintitres (A-002-2023) de fecha tres de enero de dos mil veintitres (03-01-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA GUATEMALA /EMIL ARVELIO LOPEZ GRAMAJO", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y reparación de estructuras, techos de parqueos y señalización dentro y fuera del Recinto Portuario". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2023.-			
.	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		09/02/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		09/05/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	90	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	90	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	51	56.7%
1.7	Tiempo por ejecutar	39	43.3%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 4,210,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 1,473,498.70	35.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 1,473,498.70	35.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,736,501.30	65.00%

f.

WALTER ORLANDO LÓPEZ MENDIZABA
Supervisor

