

Puerto Quetzal,
11 octubre de 2023

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

RECIBIDO
12 OCT 2023

Licenciada Jiménez:


ALAS: 15:40 F: of

En atención al oficio OF-UIP-277-2023 de fecha 20 de septiembre del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-166-2022 "Suministro de energía eléctrica y potencia".
2. Contrato Administrativo A-867-2023 "Mantenimiento de instalaciones eléctricas del Patio de Contenedores Refrigerados".
3. Contrato Administrativo A-887-2023 "Mantenimiento de pantalla aislante de temperatura en Edificio de la Gerencia de Operaciones".
4. Contrato Administrativo A-864-2023 "Mantenimiento de oficinas segundo nivel Departamento de Mantenimiento de Instalaciones".
5. Contrato Administrativo A-882-2023 "Mantenimiento y reparación de servicios sanitarios y vestidores de canchas deportivas".
6. Contrato Administrativo A-306-2023 "Mantenimiento y aplicación de pintura en paredes interiores y exteriores del Edificio Administrativo; Edificios Auxiliares I y II, y Edificaciones de las gerencias de Operaciones, Seguridad Integral, Mantenimiento, Recursos Humanos y Administrativo".
7. Contrato Administrativo A-863-2023 "Mantenimiento y reparación del techo e instalaciones del salón de usos múltiples de Colonia Portuaria".
8. Contrato Administrativo A-885-2023 "Mantenimiento de carpeta asfáltica de Prepuerto".
9. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria Quetzal.
10. Contrato Administrativo A-552-2023 "Mantenimiento de iluminación de tramo carretero de Temsa a Aldea Puerto de Hierro".
11. Contrato Administrativo A-1405-2022 "Suministro de materiales químicos para la red de agua".
12. Contrato Administrativo A-1415-2022 "Mantenimiento y reparación de red de ductos del sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo".
13. Contrato Administrativo A-878-2023 "Mantenimiento y reparación de sistemas de bombeo de agua potable".

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Ing. Wilmer Enrique Quirán Alfaro
Gerente de Mantenimiento

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL

PBX: (502) 7828-3500, 7881-1205, 7881-1555, 7881-1404, APARTADO POSTAL 07

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL

PBX: (502) 2312-5000, 2361-1370, 2332-3657, 2334-8152, 2334-4859

APARTADO POSTAL 206-A, FAX: 2361-1327

PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022
 -Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: **2359828-K**

Contrato Administrativo número A guion ciento sesenta y seis guión dos mil veintidós (A-166-2022) de fecha doce de enero de dos mil veintidós (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 11 de FEBRERO de 2022 al 10 SEPTIEMBRE de 2023.-


1		TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022				11/02/2022	
1.2	Fecha de Finalización:				10/02/2025	
1.3	Meses autorizados	36				
1.4	Meses Periodo de Transición	0				
1.5	Total de Meses del Servicio	36			100.00 %	
1.6	Meses utilizados	19			52.78 %	
1.7	Meses por ejecutar	17			47.22 %	
2						
MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA						
MESES	VALORES CONTRATADOS				PERIODO	
	KWH	QUETZALES	PORCENTAJE			
	27,901,888.00	Q 44,084,983.04	100.00 %			
2.1	FEBRERO 2022	783,546.00	Q 1,238,002.68	2.81 %	11/02/2022	10/03/2022
2.2	MARZO 2022	973,455.00	Q 1,538,058.90	3.49 %	11/03/2022	10/04/2022
2.3	ABRIL 2022	945,140.00	Q 1,493,321.20	3.39 %	11/04/2022	10/05/2022
2.4	MAYO 2022	940,800.00	Q 1,486,464.00	3.37 %	11/05/2022	10/06/2022
2.5	JUNIO 2022	816,165.00	Q 1,289,540.70	2.93 %	11/06/2022	10/07/2022
2.6	JULIO 2022	930,475.00	Q 1,470,150.50	3.33 %	11/07/2022	10/08/2022
2.7	AGOSTO 2022	1,002,120.00	Q 1,583,349.60	3.59 %	11/08/2022	10/09/2022
2.8	SEPTIEMBRE 2022	934,850.00	Q 1,477,063.00	3.35 %	11/09/2022	10/10/2022
2.9	OCTUBRE 2022	1,174,285.00	Q 1,855,370.30	4.21 %	11/10/2022	10/11/2022
2.10	NOVIEMBRE 2022	1,130,360.00	Q 1,785,968.80	4.05 %	11/11/2022	10/12/2022
2.11	DICIEMBRE 2022	1,092,700.00	Q 1,726,466.00	3.92 %	11/12/2022	10/01/2023
2.12	ENERO 2023	994,350.00	Q 1,571,073.00	3.56 %	11/01/2023	10/02/2023
2.13	FEBRERO 2023	888,545.00	Q 1,403,901.10	3.18 %	11/02/2023	10/03/2023
2.14	MARZO 2023	1,016,890.00	Q 1,606,686.20	3.64 %	11/03/2023	10/04/2023
2.15	ABRIL 2023	1,237,215.00	Q 1,954,799.70	4.43 %	11/04/2023	10/05/2023
2.16	MAYO 2023	1,296,120.00	Q 2,047,869.60	4.65 %	11/05/2023	10/06/2023
2.17	JUNIO 2023	1,193,640.00	Q 1,885,951.20	4.28 %	11/06/2023	10/07/2023

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

					Número de Nit:	2359828-K	
2.18	JULIO 2023	1,297,380.00	Q	2,049,860.40	4.65 %	11/07/2023	10/08/2023
2.19	AGOSTO 2023	1,221,010.00	Q	1,929,195.80	4.38 %	11/08/2023	10/09/2023
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		19,869,046.00		31,393,092.68	71.21 %		
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		8,032,842.00	Q	12,691,890.36	28.79 %		


Raúl Vicente Constanza Morales
SUPERVISOR





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ELECTROMECAÁNICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-867-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			8666568-5
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos sesenta y siete guión dos mil veintitres (A-867-2023) de fecha veintidos de junio de dos mil veintitres (22-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "GRUPO SEEG, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de septiembre del 2023.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		21/07/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		20/09/2023
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	2	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	2	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	2	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 534,200.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 534,200.00	100.00%

f.

HUGO DAVID LOPEZ MAYEN
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-864-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			2640083-9
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos sesenta y cuatro guión dos mil veintitres (A-864-2023) de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitres (19-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA CONSA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE OFICINAS SEGUNDO NIVEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de agosto del 2023.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		9/08/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		7/10/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	60	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	54	90.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	6	10.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 590,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 590,000.00	100.00%

f.

AXEL ARMANDO BETETA MONZON
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL


GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-882-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		83110976	
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos ochenta y dos guión dos mil veintitres (A-882-2023) de fecha cinco de julio de dos mil veintitres (05-07-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa " GRUPO GOGÉ SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES DE CANCHAS DEPORTIVAS". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de septiembre del 2023.-			
TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual	17/08/2023	
1.2	Fecha Oficial Finalización:	15/09/2023	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	30	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	30	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	14	46.7%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 824,304.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Pago ejecutado	Q 824,304.00	100.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 824,304.00	100.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.00%

f. 
 EDGAR ALBERTO GUERRA GARCÍA
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-306-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			4168238-6
En referencia al contrato administrativo numero A guión trescientos seis guión dos mil veintitres (A-306-2023) de fecha veintitres de marzo de dos mil veintitres (23-03-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "C.H. CONSTRUCTORES", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO; EDIFICIOS DE SERVICIOS AUXILIARES I Y II, Y EDIFICACIONES DE LAS GERENCIAS DE OPERACIONES, SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVO". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de septiembre del 2023.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		2/06/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		29/09/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	120	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	120	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	120	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 1,780,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,780,000.00	100.00%

f.

~~JULIAN MILIAN CONTRERAS~~
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-863-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			70703043	
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos sesenta y tres guión dos mil veintitres (A-863-2023) de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitres (19-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO E INSTALACIONES DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE COLONIA PORTUARIA". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de septiembre del 2023.-				
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual			17/08/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:			15/10/2023
			DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	60		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	60		100.0%
1.6	Tiempo utilizado	45		75.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	15		25.0%
2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q	2,984,843.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q	-	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q	-	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q	-	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado			0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado			0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado			0.000%
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q	-	0.00%
MONTO POR EJECUTAR		Q	2,984,843.00	100.00%

f.

AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-885-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-




Número de Nit:		2256892-1	
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos ochenta y cinco guión dos mil veintitres (A-885-2023) de fecha cinco de julio de dos mil veintitres (05-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE PREPUERTO". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de septiembre del 2023.-			
TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual	8/08/2023	
1.2	Fecha Oficial Finalización:	6/12/2023	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	120	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	120	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	54	45.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	66	55.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 11,839,856.27	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 11,839,856.27	100.00%

f.

ING. ERWIN ROLANDO BARRIOS TORRES

Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
ACTUALIZADOS AL 23 AGOSTO DE 2023
 -expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

8666568-5

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal, como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de Noviembre de 2021 al 23 de Agosto de 2023.

1	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO			24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60	100.00 %		
1.4	Total Meses Ejecutados	21	35.00 %		
1.5	Meses por ejecutar	39	65.00 %		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA			PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50	100.00 %		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	2.94 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	1.26 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	1.97 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	2.47 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	1.41 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	1.83 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	3.21 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	1.26 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	1.43 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	1.05 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	1.17 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	3.50 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	2.95 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	1.25 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	1.97 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	2.47 %	24/02/2023	23/03/2023

OIP




EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
ACTUALIZADOS AL 23 AGOSTO DE 2023
-expresado en tiempo y quetzales-

			Número de Nit:	8666568-5	
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	1.41 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	1.45 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	1.86 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	1.04 %	24/06/2023	23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	1.43 %	24/07/2023	23/08/2023
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q6,830,577.83	39.32 %	100.00 %	
	MONTO POR EJECUTAR	Q10,540,962.67	60.68 %		


Raul Vicente Constanza Morales
Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO**

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-552-2023
-Expresado en tiempo y quetzales-

		Número de Nit:	97961779		
Contrato Administrativo número A guion quinientos cincuenta y dos guion dos mil veintitres (A-552-2023) de fecha treinta y uno de de marzo de dos mil veintitres (31/03/2023) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Grupo Transportii, Sociedad Anónima, del "Mantenimiento de Iluminación a Tramo Carretero de Temsa a Aldea Puerto de Hierro" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 23 de MAYO de 2023 al 30 Agosto de 2023.-					
1	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-552-2023			23/05/2023	
1.2	Fecha de Finalización:			03/12/2023	
1.3	Días autorizados	195			
1.4	Días Periodo de Transición	0			
1.5	Total de días del Servicio	195	100.00 %		
1.6	Días utilizados	99	50.77 %		
1.7	Días por ejecutar	96	49.23 %		
MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA					
2	MESES			PERIODO	
		QUETZALES	PORCENTAJE		
		Q 17,911,732.26	100.00 %		
2.1	JUNIO 2023	Q 6,014,823.40	33.58 %	23/05/2023	22/06/2023
2.2	JUNIO 2023	Q 6,041,505.97	33.73 %	26/06/2023	22/08/2023
2.3	AGOSTO 2023	Q -	0.00 %	23/08/2023	30/08/2023
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		12,056,329.37	67.31 %		
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		Q 5,855,402.89	32.69 %		

Raúl Vicente Constanza Morales
SUPERVISOR



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL


GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1405-2022

-Expresado en tiempo y quezales-

Número de Nit:			97837393		
En referencia al contrato administrativo número A guión mil cuatrosientos cinco guión dos mil veintidos (A-1405-2022) de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidos (27-10-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "SUMINISTROS DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de septiembre del 2023.-					
1	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			14/12/2022	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			14/12/2023	
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado		12		
1.4	Prorroga tiempo autorizado		0		
1.5	Total tiempo autorizado		12	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado		9	75.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar		3	25.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q	526,440.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q	-	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%	
2.4	Tercer pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%	
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%	
2.6	Quinto pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%	
2.7	Sexto pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%	
2.8	Septimo pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%	
2.9	Octava pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%	
3.0	Noveno pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q	394,830.00	75.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q	131,610.00	25.00%	



JAVIER ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1415-2022
-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			8182159
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatro cientos quince guión dos mil veintidos (A-1415-2022) de fecha dieciocho de enero de dos mil veintitres (18-01-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Productos Especiales de Concreto /VINICIO GÓMEZ OVANDO", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y reparación de red de ductos del sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de septiembre del 2023.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		28/06/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		24/12/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	180	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	180	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	95	52.8%
1.7	Tiempo por ejecutar	85	47.2%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 3,187,915.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 373,275.07	11.709%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 373,275.07	11.71%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,814,639.93	88.29%

f.

JIMMY ROBERTO BARRIOS MORALES
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO





DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-878-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		12494798	
En referencia al contrato administrativo número A guión ochocientos setenta y ocho guión dos mil veintitres (A-878-2023) de fecha veintinueve de junio de dos mil veintitres (29-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA G & G", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de agosto del 2023.-			
TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual	2/08/2023	
1.2	Fecha Oficial Finalización:	20/09/2023	
	DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	50	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	50	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	50	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 2,878,500.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Pago ejecutado	Q 2,878,500.00	100.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 2,878,500.00	100.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.00%


JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

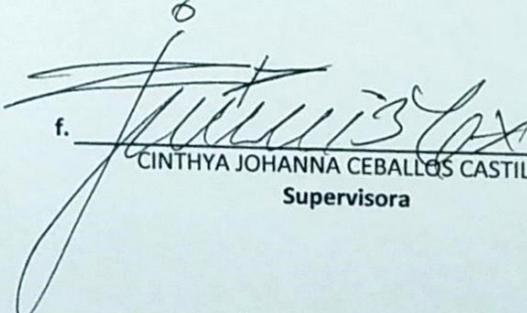
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-887-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			7070304-3	
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos ochenta y siete guión dos mil veintitres (A-887-2023) de fecha doce de julio de dos mil veintitres (12-07-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE PANTALLA AISLANTE DE TEMPERATURA EN EDIFICIO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de septiembre del 2023.-				
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual	21/08/2023		
1.2	Fecha Oficial Finalización:	4/09/2023		
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	15		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	15	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	3	20.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 2,199,948.69	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q -	0.00%	
MONTO POR EJECUTAR		Q 2,199,948.69	100.00%	

f. 
 CINTHYA JOHANNA CEBALLOS CASTILLO
 Supervisora

