




OF-600-PQ-201-2025

Puerto Quetzal,  
30 de abril de 2025

Licenciada  
**Gladys del Carmen Jiménez de León**  
Coordinadora Oficina de Información Pública  
**Empresa Portuaria Quetzal**  
Presente

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



ALAS: 15:15 F: oj

Estimada Licenciada Jiménez:

En atención al oficio OF.UIP-154-2025 de fecha 21 de abril del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-526-2024 "Mantenimiento de Carpeta Asfáltica de 7ma Avenida de Puerto Quetzal".
2. Contrato Administrativo A-473-2024 "Mantenimiento y Reparación de Servicios Sanitarios de Garita de Ingreso y Egreso al DAT".
3. Contrato Administrativo A-472-2024 "Suministro de Materiales Químicos para la Red de Agua".
4. Contrato Administrativo A-475-2024 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Arriate Central en Cerro Calle Dentro del DAT de Empresa Portuaria Quetzal".
5. Contrato Administrativo A-539-2024 "Mantenimiento y Reparación de Carpeta Asfáltica en Parqueo 7 Interior DAT Empresa Portuaria Quetzal".
6. Contrato Administrativo A-527-2024 "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Deportivas de Empresa Portuaria Quetzal".
7. Contrato Administrativo A-524-2024 "Adquisición de Planta Generadora de Electricidad, Transformador, Mantenimiento y Reparación de Edificación y Sistema Eléctrico para el área de Subestación de Puerto Quetzal".
8. Contrato Administrativo A-528-2024 "Mantenimiento del taller para casetas del patio de contenedores refrigerados".



OF-600-PQ-201-2025

Puerto Quetzal,  
30 de abril de 2025

Licenciada

**Gladys del Carmen Jiménez de León**

Coordinadora Oficina de Información Pública

**Empresa Portuaria Quetzal**

Presente

Estimada Licenciada Jiménez:

En atención al oficio OFUIP-154-2025 de fecha 21 de abril del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-526-2024 "Mantenimiento de Carpeta Asfáltica de 7ma Avenida de Puerto Quetzal".
2. Contrato Administrativo A-473-2024 "Mantenimiento y Reparación de Servicios Sanitarios de Garita de Ingreso y Egreso al DAT".
3. Contrato Administrativo A-472-2024 "Suministro de Materiales Químicos para la Red de Agua".
4. Contrato Administrativo A-475-2024 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Arriate Central en Cero Calle Dentro del DAT de Empresa Portuaria Quetzal".
5. Contrato Administrativo A-539-2024 "Mantenimiento y Reparación de Carpeta Asfáltica en Parqueo 7 Interior DAT Empresa Portuaria Quetzal".
6. Contrato Administrativo A-527-2024 "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Deportivas de Empresa Portuaria Quetzal".
7. Contrato Administrativo A-524-2024 "Adquisición de Planta Generadora de Electricidad, Transformador, Mantenimiento y Reparación de Edificación y Sistema Eléctrico para el área de Subestación de Puerto Quetzal".
8. Contrato Administrativo A-528-2024 "Mantenimiento del taller para casetas del patio de contenedores refrigerados".



9. Contrato Administrativo A-538-2024 "Mantenimiento y Reparación de instalaciones de área para gimnasio de Empresa Portuaria Quetzal".
10. Contrato Administrativo A-553-2024 "Mantenimiento de caminamiento peatonal de rotonda hacia pre-puerto Empresa Portuaria Quetzal".
11. Contrato Administrativo A-005-2025 "Mantenimiento de caminamiento peatonal de ca-09 hacia edificio capacitación Empresa Portuaria Quetzal".
12. Contrato Administrativo A-002-2025 "Mantenimiento y Reparación de tanque elevado y caseta de bombeo en sistema de agua potable de colonia habitacional Empresa Portuaria Quetzal".
13. Contrato Administrativo A-515-2024 "Mantenimiento y reparación de baches ingreso e interior DAT de Empresa Portuaria Quetzal".
14. Contrato Administrativo A-540-2024 "Adquisición de puertas de emergencia, mantenimiento y reparación de salidas de emergencia de edificaciones de Puerto Quetzal".
15. Contrato Administrativo A-543-2024 "Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas oleosas en taller electromecánico y subestación de 69 kv".
16. Contrato Administrativo A-007-2025 "Mantenimiento Edificio de Seguridad II Empresa Portuaria Quetzal".
17. Contrato Administrativo A-006-2025 "Mantenimiento de módulo de servicios sanitarios a un costado del edificio de patios y vehículos DAT Empresa Portuaria Quetzal".
18. Contrato Administrativo A-550-2024 "Mantenimiento de módulo de servicios sanitarios en 3ra avenida y 1 calle esquina basculas DAT Empresa Portuaria Quetzal".
19. Contrato Administrativo A-551-2025 "Mantenimiento de vallado perimetral área administrativa, zona 2 Empresa Portuaria Quetzal".
20. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento Preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión".
21. Contrato Administrativo A-1430-2023 y A-370-2024 "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia".
22. Contrato Administrativo A-501-2024 "Servicio de Mantenimiento y reparación del muelle flotante para embarcaciones pequeñas de Puerto Quetzal".
23. Contrato Administrativo A-545-2024 "Mantenimiento y reparación del área para limpieza abrasiva Sand Blast".




24. Contrato Administrativo A-534-2024 "Mantenimiento y reparación del Techo de lámina de las bodegas de importación y exportación dentro del DAT de Puerto Quetzal".
25. Contrato Administrativo A-001-2025 "Mantenimiento y reparación de las plantas de tratamiento y fosas sépticas de Empresa Portuaria Quetzal".

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



  
**Ing. Luis Manuel Pivaral de la Vega**  
**Subgerente de Mantenimiento**

 Archivo



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-527-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			79871097	
<p>En referencia al contrato administrativo número A guión quinientos veintisiete guión dos mil veinticuatro (A-527-2024) de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro (25-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil Individual "COCESA", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Deportivas de Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.</p>				
<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio Contractual:		10/01/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:		8/02/2025	
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>	
1.3	Tiempo autorizado	30		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	30	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	30	100.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%	
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>			<b>FECHA PERIODO</b>
2.0	Monto del contrato:	Q 899,610.00	100.00%	
2.1	Anticipo		0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q 809,649.00	90.000%	10/01/2025 29/01/2025
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 89,961.00	10.000%	30/01/2025 8/02/2025
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q 899,610.00	100.00%	
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q -	0.00%	

f.

CRISTIAN DANIEL LUNA BONILLA

Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**




**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-550-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			<b>4841875</b>
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cincuenta guión dos mil veinticuatro (A-550-2024) de fecha veintiseis de diciembre de dos mil veinticuatro (26-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORASAN GUATEMALA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN 3RA AVENIDA Y 1 CALLE ESQUINA BASCULAS DAT EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.-</p>			
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>		<b>FECHA</b>
1.1	Fecha Inicio Contractual:		7/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		24/04/2025
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>
1.3	Tiempo autorizado	42	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	42	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	42	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>		<b>FECHA PERIODO</b>
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 842,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q -	<b>0.00%</b>
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q 842,000.00	<b>100.00%</b>

f.   
 EDGAR GIOVANNI PAIZ MONTENEGRO  
 Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
GERENCIA DE MANTENIMIENTO  
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO**



**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-524-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			<b>10221401-8</b>	
En referencia al contrato administrativo número A guión quinientos veinticuatro guión dos mil veinticuatro (A-524-2024) de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro (18-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUGREEN, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, TRANSFORMADOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE SUBESTACIÓN DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.				
		<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>		<b>FECHA</b>
1.1	Fecha Inicio Contractual:			6/12/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:			3/06/2025
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>	
1.3	Tiempo autorizado	180		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	180	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	146	81.1%	
1.7	Tiempo por ejecutar	34	18.9%	
<b>2</b>		<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>		<b>FECHA PERIODO</b>
2.0	Monto del contrato:	Q 9,985,000.00	100.00%	
2.1	Anticipo		0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q 4,285,000.00	42.914%	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 950,000.00	9.514%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>		<b>Q 5,235,000.00</b>	<b>52.43%</b>	
<b>MONTO POR EJECUTAR</b>		<b>Q 4,750,000.00</b>	<b>47.57%</b>	

f.

JOSE LEONARDO RODRIGUEZ-MORALES

Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-545-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				<b>43882137</b>	
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cuarenta y cinco guión dos mil veinticuatro (A-545-2024) de fecha diez de diciembre de dos mil veinticuatro (10-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil "Multiservicios TASCO" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA PARA LIMPIEZA ABRASIVA SAND BLAST". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.-					
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			20/12/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			7/02/2025	
		DÍAS( x )	MESES( )	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	50			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	50		100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	32		64.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	18		36.0%	
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>			<b>FECHA PERIODO</b>	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q	837,000.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q	-	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q	837,000.00	100.000%	20/12/2024 12/01/2025
2.3	Segundo pago ejecutado			0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado			0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado			0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado			0.000%	
2.7	Sexto pago ejecutado			0.000%	
2.8	Septimo pago ejecutado			0.000%	
2.9	Octava pago ejecutado			0.000%	
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q	837,000.00	100.00%	
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q	-	0.00%	

f.

Valery Fernanda Sandoval Pineda  
Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
**SUPERVISOR DE OBRA CIVIL**  
GUATEMALA, C. A.



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-472-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:	99330768
----------------	----------

En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos setenta y dos guión dos mil veinticuatro (A-472-2024) de fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "N&C CORPORACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA", para el "Suministro de Materiales Químicos para la Red de Agua". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.

TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual:		6/12/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:		5/12/2025	
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>	
1.3	Tiempo autorizado	365		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	365	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	146	40.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	219	60.0%	
2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto del contrato:	Q 619,965.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%	10/02/2025 10/02/2025
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%	19/02/2025 19/02/2025
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%	7/03/2025 7/03/2025
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%	24/03/2025 24/03/2025
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%	8/04/2025 8/04/2025
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%	
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%	
2.9	Octavo pago ejecutado		0.000%	
3.0	Noveno pago ejecutado		0.000%	
<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>		<b>Q 206,655.00</b>	<b>33.33%</b>	
<b>MONTO POR EJECUTAR</b>		<b>Q 413,310.00</b>	<b>66.67%</b>	

f.

Ángel Amílcar Valdez Ortega  
Supervisor





**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-501-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				70579202		
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos uno guión dos mil veinticuatro (A-501-2024) de fecha veintidos de octubre de dos mil veinticuatro (22-10-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil Individual "CONSTRUCTORASAN HERMO" para la ejecución del proyecto "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MUELLE FLOTANTE PARA EMBARCACIONES PEQUEÑAS DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.-						
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>				<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio Contractual:				18/12/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:				5/03/2025	
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>			
1.3	Tiempo autorizado	75				
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0				
1.5	Total tiempo autorizado	75	100.0%			
1.6	Tiempo utilizado	70	93.3%			
1.7	Tiempo por ejecutar	5	6.7%			
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>				<b>FECHA PERIODO</b>	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q	898,632.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q	-	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q	365,820.00	40.709%	18/12/2024	15/01/2025
2.3	Segundo pago ejecutado	Q	532,812.00	59.291%	16/01/2025	28/02/2025
2.4	Tercer pago ejecutado			0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado			0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado			0.000%		
2.7	Sexto pago ejecutado			0.000%		
2.8	Septimo pago ejecutado			0.000%		
2.9	Octava pago ejecutado			0.000%		
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q	898,632.00	100.00%		
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q	-	0.00%		

f.

Ludín José Itz'at Herrán  
Supervisor

1	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA		
1.1	Fecha Inicio Contractual:				6/02/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:				26/03/2025	
		DÍAS( x ) MESES( )	PORCENTAJE			
1.3	Tiempo autorizado	42				
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0				
1.5	Total tiempo autorizado	42	100.0%			
1.6	Tiempo utilizado	21	50.0%			
1.7	Tiempo por ejecutar	21	50.0%			
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO		
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 795,001.00	100.00%			
2.1	Anticipo	Q -	0.000%			
2.2	Primer pago ejecutado	Q 795,001.00	100.000%		6/02/2025	26/02/2025
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%			
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%			
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%			
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%			
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%			
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%			
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%			
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q 795,001.00	100.00%			
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q -	0.00%			

f.

\_\_\_\_\_  
**JULIAN MILLAN CONTRERAS**  
 Supervisor





**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-553-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			<b>64678474</b>		
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cincuenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-553-2024) de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro (27-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Construcciones y Asesorías Catocha" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE CAMINAMIENTO PEATONAL DE ROTONDA HACIA PRE-PUERTO EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-					
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			6/02/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			22/03/2025	
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>		
1.3	Tiempo autorizado			45	
1.4	Prorroga tiempo autorizado			0	
1.5	Total tiempo autorizado			45	100.0%
1.6	Tiempo utilizado			22	48.9%
1.7	Tiempo por ejecutar			23	51.1%
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>			<b>FECHA PERIODO</b>	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q	<b>840,000.00</b>	<b>100.00%</b>	
2.1	Anticipo	Q	-	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q	<b>840,000.00</b>	100.000%	6/02/2025    27/02/2025
2.3	Segundo pago ejecutado			0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado			0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado			0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado			0.000%	
2.7	Sexto pago ejecutado			0.000%	
2.8	Septimo pago ejecutado			0.000%	
2.9	Octava pago ejecutado			0.000%	
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q	<b>840,000.00</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q	-	<b>0.00%</b>	

f.

\_\_\_\_\_  
JULIAN MILAN CONTRERAS  
Supervisor





**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-006-2025**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			<b>89904567</b>
En referencia al contrato administrativo numero A guión seis guión dos mil veinticinco (A-006-2025) de fecha ocho de enero de dos mil veinticinco (08-01-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORASAN CRISTOBAL, SOCIEDAD ANONIMA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS A UN COSTADO DEL EDIFICIO DE PATIOS Y VEHÍCULOS DAT EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.-			
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>		<b>FECHA</b>
1.1	Fecha Inicio Contractual:		7/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		8/05/2025
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>
1.3	Tiempo autorizado	63	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	63	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	55	87.3%
1.7	Tiempo por ejecutar	8	12.7%
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>		<b>FECHA PERIODO</b>
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 868,324.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q -	<b>0.00%</b>
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q 868,324.00	<b>100.00%</b>

f.

\_\_\_\_\_  
JULIAN MILIAN CONTRERAS  
Supervisor





**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-007-2025**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				<b>89789261</b>	
En referencia al contrato administrativo numero A guión siete guión dos mil veinticinco (A-007-2025) de fecha diez de enero de dos mil veinticinco (10-01-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA LAS CHARCAS, SOCIEDAD ANONIMA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO EDIFICIO DE SEGURIDAD II EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.-					
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			7/03/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			10/04/2025	
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>		
1.3	Tiempo autorizado	35			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	35	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	35	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>			<b>FECHA PERIODO</b>	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 698,000.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 698,000.00	100.000%	7/03/2025	10/04/2025
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%		
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%		
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%		
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q 698,000.00	100.00%		
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q -	0.00%		

f.

\_\_\_\_\_  
JULIAN MILIAN CONTRERAS  
Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-001-2025**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			<b>43882137</b>		
En referencia al contrato administrativo numero A guión uno guión dos mil veinticuatro (A-001-2025) de fecha seis de enero de dos mil veinticinco (06-01-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Multiservicios TASCO" para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y reparación de plantas de tratamiento y fosas sépticas de Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.-					
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			20/01/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			2/02/2025	
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>		
1.3	Tiempo autorizado	14			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	14	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	10	71.4%		
1.7	Tiempo por ejecutar	4	28.6%		
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>			<b>FECHA PERIODO</b>	
2.0	Monto modificado del contrato:	<b>Q 860,000.00</b>	<b>100.00%</b>		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	<b>Q 860,000.00</b>	100.000%	20/01/2025	29/01/2025
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%		
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%		
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%		
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>Q 860,000.00</b>	<b>100.00%</b>		
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	<b>Q -</b>	<b>0.00%</b>		



f. \_\_\_\_\_  
**JULIAN MILIAN CONTRERAS**  
Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-534-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			89904567		
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos treinta y cuatro guión dos mil veinticuatro (A-534-2024) de fecha dos de diciembre de dos mil veinticuatro (02-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, SOCIEDAD ANONIMA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DE LÁMINA DE LAS BODEGAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DENTRO DEL DAT DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.-					
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			19/12/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			16/02/2025	
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>		
1.3	Tiempo autorizado	60			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	25	41.7%		
1.7	Tiempo por ejecutar	35	58.3%		
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>			<b>FECHA PERIODO</b>	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 898,231.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 898,231.00	100.000%	19/12/2024	12/01/2025
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%		
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%		
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%		
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q 898,231.00	100.00%		
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q -	0.00%		

f.

Axel Armando Beteta Monzón  
Supervisor





**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-551-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			<b>4841875</b>		
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cincuenta y uno guión dos mil veinticuatro (A-551-2024) de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro (27-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil "CONSTRUCTORASAN GUATEMALA" para la ejecución del proyecto "Mantenimiento de vallado perimetral área administrativa, zona 2 Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.-					
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			28/02/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			10/04/2025	
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>		
1.3	Tiempo autorizado	42			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	42	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	42	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>			<b>FECHA PERIODO</b>	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 873,998.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 873,998.00	100.000%	28/02/2025	10/04/2025
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%		
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%		
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%		
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q 873,998.00	<b>100.00%</b>		
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q -	<b>0.00%</b>		

f.

\_\_\_\_\_  
JULIAN MILIAN CONTRERAS  
Supervisor





**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-473-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				38187337	
<p>En referencia al contrato administrativo número A guión cuatrocientos setenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-473-2024) de fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Servicios Sanitarios de Garita de Ingreso y Egreso al Dat". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.</p>					
<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>				<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			30/10/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			18/11/2024	
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>		
1.3	Tiempo autorizado	20			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	20	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	20	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>			<b>FECHA PERIODO</b>	
2.0	Monto del contrato:	Q 781,245.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 451,929.40	57.85%	30/10/2024	6/11/2024
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>		<b>Q 451,929.40</b>	<b>57.85%</b>		
<b>MONTO POR EJECUTAR</b>		<b>Q 329,315.60</b>	<b>42.15%</b>		

f. \_\_\_\_\_  
JULIÁN MILIÁN CONTRERAS  
Supervisor





**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-539-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			79871097		
En referencia al contrato administrativo número A guión quinientos treinta y nueve guión dos mil veinticuatro (A-539-2024) de fecha doce de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil Individual "COCESA", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Carpeta Asfáltica en Parqueo 7 Interior Dat Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.					
TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			24/01/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			24/03/2025	
		DÍAS( x ) MESES( )	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado	60			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	60	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto del contrato:	Q 11,940,703.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.00%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 2,388,140.60	20.000%		24/01/2025 13/02/2025
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>		<b>Q 2,388,140.60</b>	<b>20.00%</b>		
<b>MONTO POR EJECUTAR</b>		<b>Q 9,552,562.40</b>	<b>80.00%</b>		

f.

  
JULIAN MILIAN CONTRERAS  
Supervisor





**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-475-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			<b>38187337</b>
<p>En referencia al contrato administrativo número A guión cuatrocientos setenta y cinco guión dos mil veinticuatro (A-475-2024) de fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro (11-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA", para la ejecución del proyecto "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Arriate Central en Cerro Calle Dentro del Dat de Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.</p>			
<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>
1.1	Fecha Inicio Contractual:		5/12/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		15/01/2025
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>
1.3	Tiempo autorizado	42	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	42	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	42	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>		<b>FECHA PERIODO</b>
2.0	Monto del contrato:	Q 690,398.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q -	<b>0.00%</b>
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q 690,398.00	<b>100.00%</b>

f.

JULIAN MILIAN CONTRERAS

Supervisor





**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**




**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-526-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				75631237	
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos veintiséis guión dos mil veinticuatro (A-526-2024) de fecha veintidos de noviembre de dos mil veinticuatro (22-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil Individual "CONSTRUCTORA ODECO", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento de Carpeta Asfáltica de 7ma Avenida de Puerto Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.</p>					
<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>				<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			12/02/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			12/05/2025	
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>		
1.3	Tiempo autorizado	90			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	90	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	78	86.7%		
1.7	Tiempo por ejecutar	12	13.3%		
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>			<b>FECHA PERIODO</b>	
2.0	Monto del contrato:	Q 8,996,785.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 4,399,360.00	48.90%	12/02/2025	15/03/2025
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 4,597,425.00	51.101%	16/03/2025	10/04/2025
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>		<b>Q 8,996,785.00</b>	<b>100.00%</b>		
<b>MONTO POR EJECUTAR</b>		<b>Q -</b>	<b>0.00%</b>		

f.  **EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**SUPERVISOR DE OBRA CIVIL**  
 AXEL ARMANDO  
 Supervisora GUATEMALA, C. A.



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



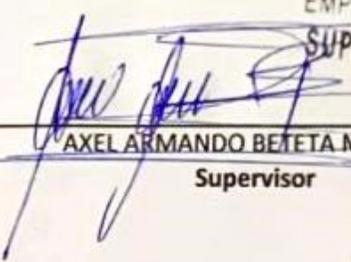
**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-538-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			<b>79871097</b>		
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos treinta y ocho guión dos mil veinticuatro (A-538-2024) de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "COCESA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE ÁREA PARA GIMNASIO DE EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-					
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			24/01/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			22/02/2025	
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>		
1.3	Tiempo autorizado	30			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	30	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	30	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>			<b>FECHA PERIODO</b>	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 899,975.00	100.00%		
2.1	Anticipo	-	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 899,975.00	100.000%	24/01/2025	22/02/2025
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%		
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%		
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%		
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>Q 899,975.00</b>	<b>100.00%</b>		
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>		<b>0.00%</b>		

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL  
GUATEMALA, C. A.

f.   
AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN  
Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**




**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-528-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			<b>2872996K</b>		
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos veintiocho guión dos mil veinticuatro (A-528-2024) de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro (25-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Innovaciones Generales en Construcción IGC", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DEL TALLER PARA CASSETAS DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-					
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			24/01/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			17/02/2025	
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>		
1.3	Tiempo autorizado	25			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	25	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	25	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>			<b>FECHA PERIODO</b>	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 830,000.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 830,000.00	100.000%	24/01/2025	17/02/2025
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%		
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%		
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%		
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>Q 830,000.00</b>	<b>100.00%</b>		
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	<b>Q -</b>	<b>0.00%</b>		

f.  **EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**SUPERVISOR DE OBRA CIVIL**  
**AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN, C. A.**  
**Supervisor**



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**




**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-543-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			<b>23587105</b>
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cuarenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-543-2024) de fecha cinco de diciembre de dos mil veinticuatro (05-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS OLEOSAS EN TALLER ELECTROMECAÁNICO Y SUBESTACIÓN DE 69 KV". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.-			
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>		<b>FECHA</b>
1.1	Fecha Inicio Contractual:		15/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		8/04/2025
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>
1.3	Tiempo autorizado		25
1.4	Prorroga tiempo autorizado		0
1.5	Total tiempo autorizado		25 100.0%
1.6	Tiempo utilizado		25 100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar		0 0.0%
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>		<b>FECHA PERIODO</b>
2.0	Monto modificado del contrato:	<b>Q 250,000.00</b>	<b>100.00%</b>
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>Q -</b>	<b>0.00%</b>
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	<b>Q 250,000.00</b>	<b>100.00%</b>

f.   
**AXEL ARMANDO BETANCOURT**  
 Supervisor  
**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**SUPERVISOR DE OBRA CIVIL**  
 UNIONIZADA, C. A.



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**




**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-540-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			<b>38187337</b>
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cuarenta guión dos mil veinticuatro (A-540-2024) de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 Guatemala, Sociedad Anónima" para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA DE EDIFICACIONES DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.-			
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>		<b>FECHA</b>
1.1	Fecha Inicio Contractual:		12/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		9/07/2025
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>
1.3	Tiempo autorizado	120	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	120	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	50	41.7%
1.7	Tiempo por ejecutar	70	58.3%
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>		<b>FECHA PERIODO</b>
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 2,850,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q -	<b>0.00%</b>
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q 2,850,000.00	<b>100.00%</b>

  
 f. **AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN, A.**  
 Supervisor  
 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
 SUPERVISOR DE OBRA CIVIL  
 GUATEMALA



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**




**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-515-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			66894972		
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos quince guión dos mil veinticuatro (A-515-2024) de fecha siete de noviembre de dos mil veinticuatro (07-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil "CONSTRUCTORA H&M" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BACHES INGRESO E INTERIOR DAT DE EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2025.-					
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio Contractual:				12/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:				9/06/2025
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>			<b>PORCENTAJE</b>
1.3	Tiempo autorizado	90			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	90	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	22	24.4%		
1.7	Tiempo por ejecutar	68	75.6%		
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>			<b>FECHA PERIODO</b>	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 2,697,142.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 2,697,142.00	100.000%	12/03/2025	2/04/2025
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%		
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%		
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%		
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>Q 2,697,142.00</b>	<b>100.00%</b>		
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	<b>Q -</b>	<b>0.00%</b>		

  
 f. AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN  
 Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
 SUPERVISOR DE OBRA CIVIL  
 GUATEMALA, C. A.



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-002-2025**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				<b>89789261</b>		
En referencia al contrato administrativo numero A guión dos guión dos mil veinticinco (A-002-2025) de fecha seis de enero de dos mil veinticinco (06-01-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA LAS CHARCAS, SOCIEDAD ANONIMA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CASETA DE BOMBEO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COLONIA HABITACIONAL EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-						
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>				<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio Contractual:				12/02/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:				11/03/2025	
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>			
1.3	Tiempo autorizado	28				
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0				
1.5	Total tiempo autorizado	28	100.0%			
1.6	Tiempo utilizado	6	21.4%			
1.7	Tiempo por ejecutar	22	78.6%			
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>				<b>FECHA PERIODO</b>	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 598,000.00	100.00%			
2.1	Anticipo	Q -	0.000%			
2.2	Primer pago ejecutado	Q 598,000.00	100.000%	12/02/2025	17/02/2025	
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%			
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%			
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%			
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%			
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%			
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%			
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%			
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>Q 598,000.00</b>	<b>100.00%</b>			
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	<b>Q -</b>	<b>0.00%</b>			

f.   
**AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN**  
 Supervisor

SUPERVISOR DE OBRA CIVIL  
 S.A. G.A.


**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
GERENCIA DE MANTENIMIENTO  
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO**

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023 Y A-370-2024

Número de Nit: **2359828-K**

Contratos Administrativos número A guion mil cuatrocientos treinta guión dos mil veintitres (A-1430-2023) y A guión trescientos setenta guion dos mil veinticuatro (A-370-2024) , suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América, Limitada. del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 01 de MARZO de 2024 al 31 de MARZO de 2025.-

1		TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-1430-2023			01/03/2024		
1.2	Fecha de Finalización:			28/02/2027		
1.3	Meses autorizados	36				
1.4	Meses Periodo de Transición	0				
1.5	Total de Meses del Servicio	36	100.00 %			
1.6	Meses utilizados	13	36.11 %			
1.7	Meses por ejecutar	23	63.89 %			
<b>MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA</b>						
2	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO	
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE		
		33,349,748.47	Q 63,031,024.61	100.00 %		
2.1	31/03/24	1,505,245.00	Q 2,844,913.05	4.51 %	01/03/2024	31/03/2024
2.2	30/04/24	1,513,155.00	Q 2,859,862.95	4.54 %	01/04/2024	30/04/2024
2.3	31/05/24	1,451,555.00	Q 2,743,438.95	4.35 %	01/05/2024	31/05/2024
2.4	30/06/24	1,261,890.00	Q 2,384,972.10	3.78 %	01/06/2024	30/06/2024
2.5	31/07/24	1,345,330.00	Q 2,542,673.70	4.03 %	01/07/2024	31/07/2024
2.6	31/08/24	1,375,045.00	Q 2,598,835.05	4.12 %	01/08/2024	31/08/2024
2.7	30/09/24	1,346,205.00	Q 2,544,327.45	4.04 %	01/09/2024	30/09/2024
2.8	31/10/24	1,400,035.00	Q 2,646,066.15	4.20 %	01/10/2024	31/10/2024
2.9	30/11/24	1,439,200.00	Q 2,720,088.00	4.32 %	01/11/2024	30/11/2024
2.10	31/12/24	1,437,485.00	Q 2,716,846.65	4.31 %	01/12/2024	31/12/2024
2.11	31/01/25	1,399,370.00	Q 2,644,809.30	4.20 %	01/01/2025	31/01/2025
2.12	28/02/25	1,360,625.00	Q 2,571,581.25	4.08 %	01/02/2025	28/02/2025
2.13	31/03/25	1,570,905.00	Q 2,969,010.45	4.71 %	01/03/2025	31/03/2025
<b>MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO</b>		<b>18,406,045.00</b>	<b>34,787,425.05</b>	<b>55.19 %</b>	<b>100.00 %</b>	
<b>MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO</b>			<b>Q 28,243,599.56</b>	<b>44.81 %</b>		




Raúl Vicente Constanza Morán  
Supervisor

 <b>EMPRESA PORTUARIA QUETZAL</b> <b>GERENCIA DE MANTENIMIENTO</b> <b>DEPARTAMENTO ELÉCTRICO</b>	
<b>CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022</b> <b>ACTUALIZADOS AL 23 MARZO DE 2025</b> -expresado en tiempo y quetzales-	

Número de Nit: **8666568-5**

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal, como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de NOVIEMBRE de 2021 al 23 de MARZO de 2025.

1	TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA		
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO				24/11/2021		
1.2	Fecha Oficial Finalización:				23/11/2026		
1.3	Meses Autorizados	60		100.00 %			
1.4	Total Meses Ejecutados	40		66.67 %			
1.5	Meses por ejecutar	20		33.33 %			
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA		SALDO	% EJECUTADO	% X EJECUTAR	PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50		100.00 %	100.00 %		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	Q16,861,374.09	2.94 %	97.06 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	Q16,642,464.49	1.26 %	95.80 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	Q16,299,658.03	1.97 %	93.83 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	Q15,871,323.19	2.47 %	91.36 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	Q15,626,828.76	1.41 %	89.96 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	Q15,309,493.56	1.83 %	88.13 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	Q14,751,165.83	3.21 %	84.92 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	Q14,532,256.23	1.26 %	83.66 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	Q14,283,187.05	1.43 %	82.22 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	Q14,100,348.39	1.05 %	81.17 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	Q13,897,859.56	1.17 %	80.00 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	Q13,290,682.80	3.50 %	76.51 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	Q12,778,914.79	2.95 %	73.56 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	Q12,561,606.79	1.25 %	72.31 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	Q12,218,800.33	1.97 %	70.34 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	Q11,790,465.49	2.47 %	67.87 %	24/02/2023	23/03/2023
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	Q11,545,971.06	1.41 %	66.46 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	Q11,293,282.26	1.45 %	65.01 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	Q10,970,066.25	1.86 %	63.15 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	Q10,790,031.85	1.04 %	62.11 %	24/06/2023	23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	Q10,540,962.67	1.43 %	60.68 %	24/07/2023	23/08/2023
2.22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	Q10,358,124.01	1.05 %	59.63 %	24/08/2023	23/09/2023

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
GERENCIA DE MANTENIMIENTO  
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022  
ACTUALIZADOS AL 23 MARZO DE 2025  
-expresado en tiempo y quetzales-

						Número de Nit:	8666568-5
2.23	Monto ejecutado Informe 23	Q202,488.83	Q10,155,635.18	1.17 %	58.46 %	24/09/2023	23/10/2023
2.24	Monto ejecutado Informe 24	Q333,477.88	Q9,822,157.30	1.92 %	56.54 %	24/10/2023	23/11/2023
2.25	Monto ejecutado Informe 25	Q702,926.27	Q9,119,231.03	4.05 %	52.50 %	24/11/2023	23/12/2023
2.26	Monto ejecutado Informe 26	Q217,308.00	Q8,901,923.03	1.25 %	51.24 %	24/12/2023	23/01/2024
2.27	Monto ejecutado Informe 27	Q250,670.78	Q8,651,252.25	1.44 %	49.80 %	24/01/2024	23/02/2024
2.28	Monto ejecutado Informe 28	Q181,237.06	Q8,470,015.19	1.04 %	48.76 %	24/02/2024	23/03/2024
2.29	Monto ejecutado Informe 29	Q242,892.83	Q8,227,122.36	1.40 %	47.36 %	24/03/2024	23/04/2024
2.30	Monto ejecutado Informe 30	Q252,688.80	Q7,974,433.56	1.45 %	45.91 %	24/04/2024	23/05/2024
2.31	Monto ejecutado Informe 31	Q323,216.01	Q7,651,217.55	1.86 %	44.04 %	24/05/2024	23/06/2024
2.32	Monto ejecutado Informe 32	Q180,034.40	Q7,471,183.15	1.04 %	43.01 %	24/06/2024	23/07/2024
2.33	Monto ejecutado Informe 33	Q250,670.78	Q7,220,512.37	1.44 %	41.57 %	24/07/2024	23/08/2024
2.34	Monto ejecutado Informe 34	Q196,525.06	Q7,023,987.31	1.13 %	40.43 %	24/08/2024	23/09/2024
2.35	Monto ejecutado Informe 35	Q202,488.83	Q6,821,498.48	1.17 %	39.27 %	24/09/2024	23/10/2024
2.36	Monto ejecutado Informe 36	Q335,079.48	Q6,486,419.00	1.93 %	37.34 %	24/10/2024	23/11/2024
2.37	Monto ejecutado Informe 37	Q701,324.67	Q5,785,094.33	4.04 %	33.30 %	24/11/2024	23/12/2024
2.38	Monto ejecutado Informe 38	Q217,308.00	Q5,567,786.33	1.25 %	32.05 %	24/12/2024	23/01/2025
2.39	Monto ejecutado Informe 39	Q250,670.78	Q5,317,115.55	1.44 %	30.61 %	24/01/2025	23/02/2025
2.40	Monto ejecutado Informe 40	Q181,237.06	Q5,135,878.49	1.04 %	29.56 %	24/02/2025	23/03/2025
<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>		<b>Q12,235,662.01</b>	<b>70.44 %</b>			<b>100.00 %</b>	
<b>MONTO POR EJECUTAR</b>		<b>Q5,135,878.49</b>	<b>29.56 %</b>				

Raúl Vicente Constanza Morales  
Supervisor
